UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

## Trabajo Práctico N°2 - Unidad 4

# DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

**Alumno**

Gonzales Trebotich Pablo

**Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.**

**Organización Empresarial**

**Docente Titular**

Bruno, Carolina

**Docente Tutor**

Gangge Laureana

06 de Octubre de 2026

## Tabla de contenido

Consignas 3

Desarrollo

Introducción 3

Consigna 1 4 - 5

Consigna 2 6

Consigna 3 7 - 8

Conclusión 9

Uso de IA 10

# *INTRODUCCIÓN*

En la primera etapa del trabajo se analizó la empresa Patagonia Software y se identificó como problemática la falta de comunicación y coordinación entre las distintas áreas durante el desarrollo de los proyectos.


Como solución, se propuso implementar un sistema de gestión de clientes y proyectos que permita centralizar la información y facilitar el seguimiento de cada proyecto por parte de las distintas áreas de la empresa.

En esta segunda etapa, se realizará el análisis FODA de la solución propuesta, se establecerán los objetivos y las metas que se buscan alcanzar y se planificará el desarrollo e implementación del sistema mediante un Diagrama de Gantt.

# *CONSIGNA 1:*

# *ANÁLISIS FODA DEL PROYECTO:*

Para analizar la viabilidad y el desarrollo del sistema de gestión de clientes y proyectos propuesto para Patagonia Software, se realizó un análisis FODA teniendo en cuenta los factores internos del equipo técnico y los factores externos del entorno que pueden favorecer o dificultar su desarrollo e implementación.

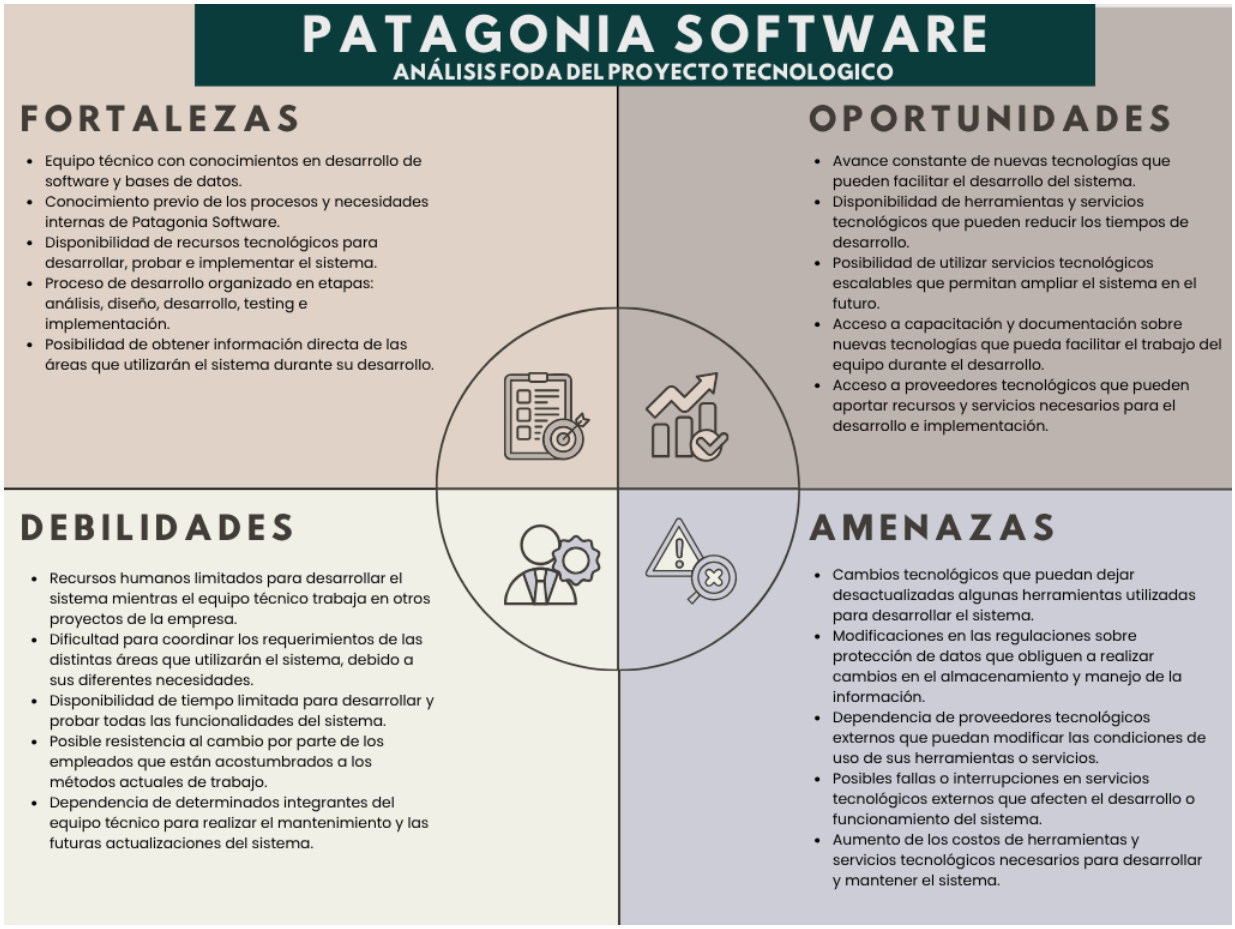

# *ESTRATEGIAS DEL ANÁLISIS FODA*

- ***Estrategia FO (Fortalezas + Oportunidades):*** Aprovechar los conocimientos del equipo técnico en desarrollo de software y bases de datos, junto con las herramientas tecnológicas disponibles en el mercado, para facilitar el desarrollo del sistema de gestión de clientes y proyectos.
- ***Estrategia DO (Debilidades + Oportunidades):*** Utilizar herramientas y servicios tecnológicos que permitan agilizar las tareas de desarrollo, teniendo en cuenta que el equipo técnico dispone de recursos humanos limitados y también debe trabajar en otros proyectos de la empresa.
- ***Estrategia FA (Fortalezas + Amenazas):*** Aprovechar los conocimientos del equipo técnico para seleccionar herramientas tecnológicas que puedan mantenerse actualizadas y adaptarse a posibles cambios tecnológicos durante el desarrollo y mantenimiento del sistema.
- ***Estrategia DA (Debilidades + Amenazas):*** Documentar el funcionamiento y mantenimiento del sistema para reducir la dependencia de determinados integrantes del equipo técnico y facilitar la resolución de problemas ante posibles cambios o interrupciones en los servicios de proveedores tecnológicos externos.

# *CONSIGNA 2:*

## OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar e implementar un sistema de gestión de clientes y proyectos para Patagonia Software que permita centralizar la información de los clientes, registrar y actualizar el avance de cada proyecto y mejorar la comunicación y coordinación entre las distintas áreas de la empresa.

## METAS:

- ***TIEMPO DE RESPUESTA:*** Lograr que las consultas y actualizaciones principales del sistema tengan un tiempo de respuesta menor a 3 segundos.
- ***COBERTURA:*** Registrar en el sistema el 100 % de los proyectos activos de Patagonia Software junto con su etapa actual de desarrollo.
- ***PLAZO DE DESARROLLO:*** Desarrollar e implementar una primera versión funcional del sistema en un plazo máximo de 7 semanas.
- ***CALIDAD:*** Lograr que al menos el 95 % de las funcionalidades definidas superen correctamente las pruebas antes de la implementación.
- ***IMPACTO EN LA GESTIÓN DE COBROS:*** Reducir en un 30% el tiempo promedio de gestión de cobros por avances de proyecto durante los primeros tres meses posteriores a la implementación del sistema.

# *CONSIGNA 3:*

# *PLANIFICACIÓN TEMPORAL:*

Para llevar adelante el desarrollo del sistema se establecieron las principales etapas del proyecto, definiendo su duración, dependencia y los responsables de cada una.

***ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS:*** Se analizarán las necesidades de las distintas áreas de Patagonia Software para determinar las funcionalidades que deberá tener el sistema de gestión de clientes y proyectos. Se definirán los datos que se deberán registrar, consultar y actualizar sobre cada cliente y proyecto.

- *DURACIÓN:* 1 Semana
- *RESPONSABLE:* Analista de sistemas.
- *PRECEDENCIA:* Inicio del proyecto

***DISEÑO DEL SISTEMA:*** Se diseñará la estructura del sistema, la base de datos y las interfaces necesarias para gestionar la información de clientes y proyectos.

- *DURACIÓN:* 1 Semana
- *RESPONSABLE:* Diseñador / Arquitecto de Software
- *PRECEDENCIA:* Finalización del análisis de requerimientos

***CODIFICACIÓN Y DESARROLLO:*** Se desarrollarán las funcionalidades definidas, como el registro de clientes y proyectos, la consulta de información y la actualización del estado de cada proyecto.

- *DURACIÓN:* 3 Semanas.
- *RESPONSABLE:* Equipo de desarrollo.
- *PRECEDENCIA:* Finalización del diseño.

***PRUEBAS DE CALIDAD:*** Se realizarán pruebas progresivas sobre las funcionalidades desarrolladas para detectar errores y comprobar que el sistema cumpla con los

requerimientos definidos. Las pruebas podrán realizarse en paralelo con el desarrollo a medida que se completen las distintas funcionalidades.

- *DURACIÓN:* 3 Semanas.
- *RESPONSABLE:* Equipo de testing.
- *PRECEDENCIA:* Disponibilidad de funcionalidades desarrolladas para ser probadas.

***IMPLEMENTACIÓN:*** Se implementará la primera versión funcional del sistema para que pueda comenzar a ser utilizada por las distintas áreas de Patagonia Software.

- *DURACIÓN:* 1 Semana.
- *RESPONSABLE:* Equipo de Desarrollo e Implementación.
- *PRECEDENCIA:* Finalización y aprobación de las pruebas de calidad.

**Diagrama de Gantt – Desarrollo e implementación del sistema de gestión de clientes y proyectos**
Duración total: 7 semanas

| N° | Actividad | Responsable | Precedencia | Duración (semanas) | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Análisis de requerimientos** | Analista de sistemas | Inicio del proyecto | 1 | | | | | | | |
| 2 | **Diseño del sistema** | Diseñador/Arquitecto de software | Análisis de requerimientos terminado | 1 | | | | | | | |
| 3 | **Codificación y desarrollo** | Equipo de desarrollo | Diseño del sistema terminado | 3 | | | | | | | |
| 4 | **Pruebas de calidad** | Equipo de testing | Funcionalidades disponibles | 3 | | | | | | | |
| 5 | **Implementación** | Equipo de desarrollo e implementación | Pruebas de calidad aprobadas | 1 | | | | | | | |

**Referencias:** Análisis de requerimientos · Diseño del sistema · Codificación y desarrollo · Pruebas de calidad · Implementación · → Dependencia entre actividades

# *CONCLUSIÓN:*

A partir de este trabajo pude analizar la viabilidad del proyecto de Patagonia Software y organizar de una manera más clara cómo se llevaría adelante el desarrollo del sistema de gestión de clientes y proyectos.

Mediante el análisis FODA pude identificar los factores internos y externos que pueden influir en el desarrollo del proyecto. Además, con el objetivo y las metas pude establecer de forma más concreta qué se busca lograr con el sistema.

Por último, con el Diagrama de Gantt pude organizar las distintas etapas del desarrollo, estableciendo los tiempos, responsables y el orden en que se realizarán las tareas.

De esta manera, se puede tener una planificación más clara para desarrollar e implementar el sistema propuesto, teniendo en cuenta los recursos disponibles y las posibles dificultades que puedan aparecer durante el proyecto.

## *DECLARACIÓN Y TRANSPARENCIA SOBRE EL USO DE IA:*

Para realizar este trabajo utilicé ChatGPT como herramienta de apoyo para interpretar las consignas, organizar las ideas, desarrollar y revisar algunos apartados, mejorar la redacción y corregir errores ortográficos.

El trabajo se realizó tomando como base la problemática y la solución planteadas en la primera etapa, junto con los conceptos estudiados en la materia y las correcciones realizadas por la profesora.
